



NBP

Narodowy Bank Polski

Weronika Lip, Departament Systemu Płatniczego NBP


Projekt Konsolidacja T2-T2S – zmiana harmonogramu oraz stan prac w NBP



Plan prezentacji:

- I. Dotychczasowy harmonogram realizacji Projektu Konsolidacja T2-T2S
- II. Zmiana terminu realizacji Projektu Konsolidacja T2-T2S
- III. Nowy harmonogram realizacji Projektu Konsolidacja T2-T2S / Plan działalności NBP na lata 2021-2023
- IV. Zmiana harmonogramu prac EBC – kamienie milowe przygotowań do migracji
- V. Stan prac w NBP oraz działania na najbliższe miesiące

Pierwotny harmonogram realizacji Projektu Konsolidacja T2-T2S (Plan działalności NBP na lata 2020-2022 r.)

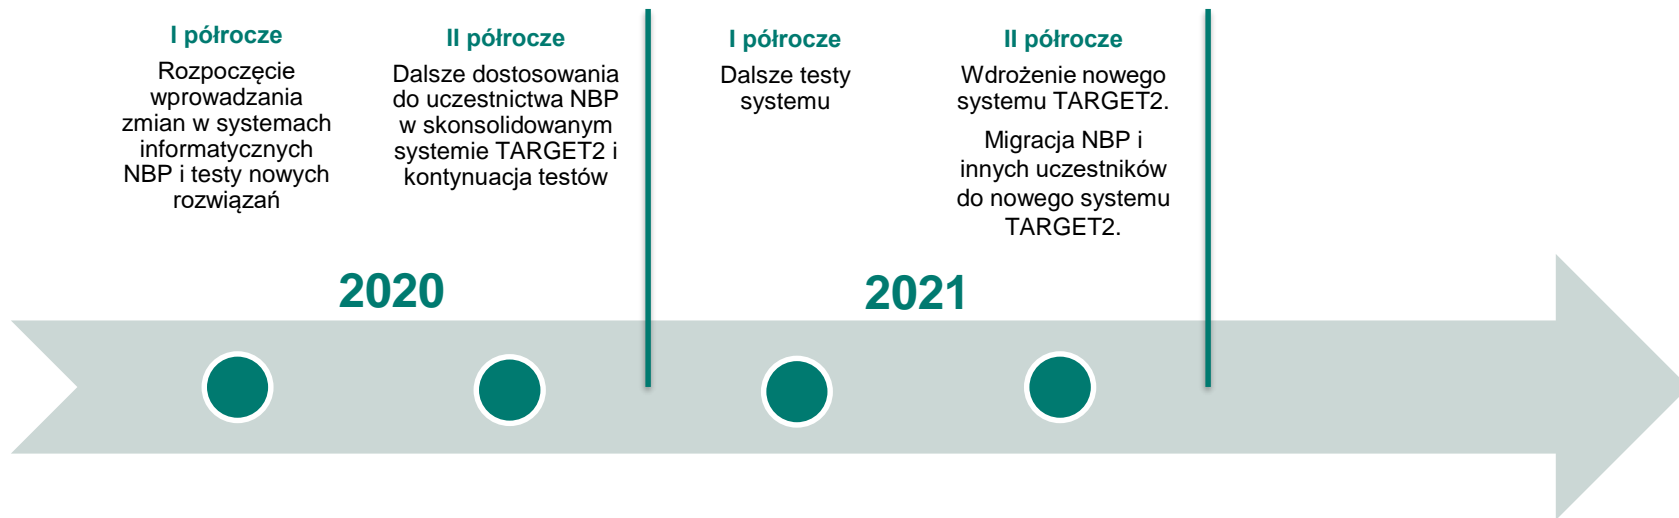

Zmiana terminu realizacji Projektu Konsolidacja T2-T2S (1/2)

- Przesłanki wprowadzenia zmiany przez EBC:
 - Decyzja Towarzystwa SWIFT z marca 2020 r. o przesunięciu o rok terminu implementacji komunikatów zgodnych ze standardem ISO 20022, z listopada 2021 r. na grudzień 2022 r., i wywołane tą decyzją trudności w realizacji przez uczestników systemu TARGET2 projektu Konsolidacja T2-T2S

Utrzymanie przez EBC dotychczasowego terminu realizacji projektu Konsolidacja T2-T2S oznaczać mogłoby konieczność obsługiwaną przez uczestników TARGET2 przez rok (od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r.) komunikatów w dwóch różnych standardach, co byłoby kosztowne i wymagało zwiększonych nakładów pracy


- Utrudnienia w prowadzonych przez uczestników TARGET2 pracach bieżących oraz przygotowaniach do projektu Konsolidacja T2-T2S, wywołane epidemią COVID-19 i wdrożonymi środkami zaradczymi

Zmiana terminu realizacji Projektu Konsolidacja T2-T2S (2/2)

- Decyzja Rady Prezesów EBC z dnia 22 lipca 2020 r. o przesunięciu terminu realizacji Konsolidacji T2-T2S o rok, z listopada 2021 r. na listopad 2022 r.
- Zmiana harmonogramu realizacji Projektu Konsolidacja T2-T2S w NBP – decyzja Zarządu NBP z dnia 27 października 2020 r. *Przygotowanie do uczestnictwa w skonsolidowanym systemie TARGET2*

Nowy harmonogram realizacji Projektu Konsolidacja T2-T2S

Plan działalności NBP na lata 2021-2023 r.

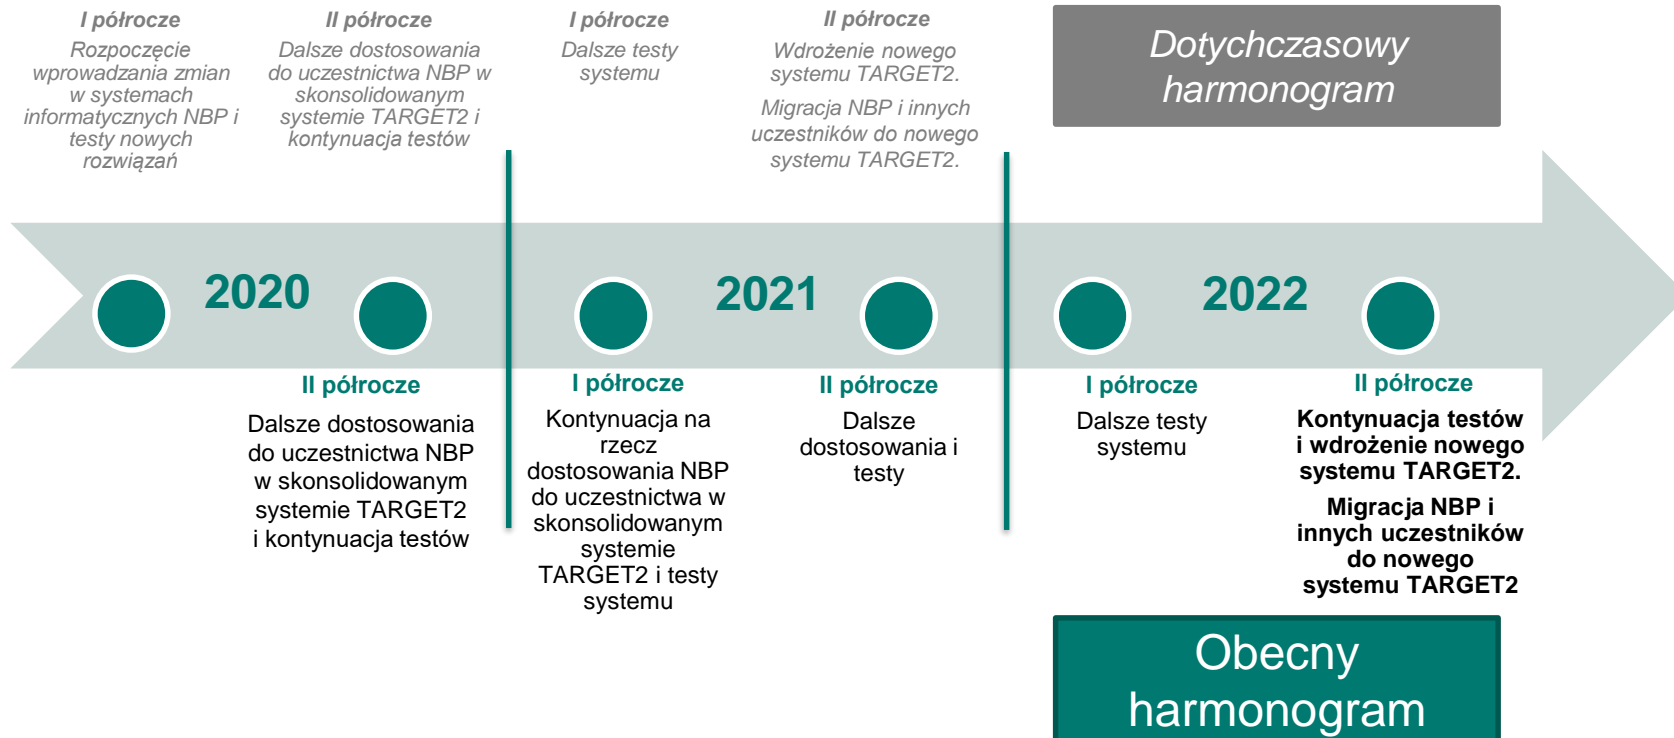

Zmiana harmonogramu prac EBC – kamienie milowe przygotowań do migracji

- Konieczność aktualizacji harmonogramu przygotowań do migracji z związku z przedłużeniem czasu realizacji projektu:
 - zmiana terminów poszczególnych kamieni milowych (od marca 2020 r.)
 - różne terminy kamieni milowych dla banków centralnych i dla uczestników
 - dodanie nowych kamieni milowych (z zakresu prac dostosowawczych w systemach informatycznych oraz testów)
- Zmiana kamieni milowych opracowana przez MTRSG i TSWG, zatwierdzona przez MIB w dniu 20 października 2020 r.
- Aktualizacja listy kamieni milowych przez EBC – dokument *Key milestones for participants* przekazany uczestnikom TARGET2-NBP w dniu 16 listopada br.

Kamienie milowe przygotowań do migracji – *Key Milestones (1/2)*

źródło: EBC

Milestone	New date	Old date	Status
<i>PSE - T2-T2S Consolidation project set-up</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>Completed</i>
<i>IAD1 - Internal adaptation/assessment started</i>	<i>31/03/2019</i>	<i>31/03/2019</i>	<i>Completed</i>
<i>IAD2 - Impact assessment completed</i>	<i>30/09/2019</i>	<i>30/09/2019</i>	<i>Completed</i>
<i>IAD3 - Drafting of internal applications documentation started</i>	<i>30/09/2019</i>	<i>30/09/2019</i>	<i>Completed</i>
<i>IAD4 - Drafting of internal applications documentation completed</i>	<i>31/03/2020</i>	<i>31/03/2020</i>	<i>Completed</i>
<i>IAD5 - Software development for the required adaptation changes to T2 started</i>	<i>31/03/2020</i>	<i>31/03/2020</i>	<i>Completed</i>
IAD6 - Software development for the required adaptation changes to T2 completed (Participants)	30/06/2021	31/10/2020	Date changed
IAD7 - Testing of the internal applications started (Participants)	01/03/2021	30/06/2020	Date changed
IAD8 - Testing of the internal applications completed (Participants)	31/08/2021	31/12/2020	Date changed
<i>NSP1 - NSPs selection criteria development completed</i>	<i>15/07/2019</i>	<i>15/07/2019</i>	<i>Completed</i>
<i>NSP2 - New connectivity design strategy and planning completed</i>	<i>31/12/2019</i>	<i>31/12/2019</i>	<i>Completed</i>
NSP3 - NSPs selection and contracts preparation completed (Participants)	31/03/2021	31/07/2020	Date changed
NSP4 - Network Service Providers procurement completed (Participants)	30/06/2021	31/10/2020	Date changed

Kamienie milowe przygotowań do migracji – *Key Milestones (2/2)*

źródło: EBC

Milestone	New date	Old date	Status
NCO1 - Network connectivity tests started (Participants)	01/09/2021	31/12/2020	Date changed
NCO2 - Network connectivity tests completed (Participants)	30/11/2021	28/02/2021	Date changed
UTA1 - User Testing activities started (Participants and CBs)	01/12/2021	28/02/2021	New task (previously included in NCO2)
UTA2 - User testing activities completed (Participants and CBs)	30/09/2022	30/09/2021	Date changed
CLA - Contractual and legal adaptation completed (Participants and CBs)	30/09/2022	30/09/2021	Date changed
IST1- Training for user testing started (Participants and CBs)	01/09/2021	NA	New task
IST2 - Training for user testing completed (Participants and CBs)	30/11/2021	30/09/2021	Date changed/milestone renamed
OPA - Operational procedures adaptation completed (Participants and CBs)	30/09/2022	30/09/2021	Date changed
NCOP1 - Network connectivity tests on production started (Participants and CBs)	01/05/2022	NA	New task
NCOP2 - Network connectivity tests on production completed (Participants and CBs)	31/07/2022	NA	New task
MIG1 - Pre-migration activities on production environment started (Participants and CBs)	22/08/2022	01/10/2021	Date changed/milestone renamed
MIG2 - Pre-migration activities completed (Participants and CBs)	31/10/2022	05/11/2021	Date changed/milestone renamed
GLI - Go-live of T2 service (first business day)	21/11/2022	22/11/2021	Date changed

Stan prac w NBP oraz działania na najbliższe miesiące

- NBP:
 - zdefiniowano zmiany w systemach informatycznych NBP
 - NSP wybrany – SWIFT
 - trwają prace nad implementacją zmian w systemach informatycznych oraz nad specyfikacją wymagań gestora dla aplikacji wewnętrznej
- Kolejny raport na temat poziomu gotowości uczestników do migracji zostanie przeprowadzony w styczniu 2021 r., wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
 - ankieta zostanie rozesłana do uczestników do dnia 18 grudnia br.
 - pytania o zrealizowanie przez uczestników dotychczasowych kamieni milowych
 - najbliższy termin realizacji kolejnych kamieni milowych upływa w dniu 31 marca 2021 r.
- Testy użytkowników rozpoczną się w grudniu 2021 r.
- Migracja do nowego systemu – 21 listopada 2022 r.
- Pytania i informacje o aktualnych danych kontaktowych uczestników na adres: T2konsolidacja@nbp.pl



Narodowy Bank Polski

Weronika Lip

Doradca

Departament Systemu Płatniczego

tel. +48 22 185 41 99

mail: weronika.lip@nbp.pl
